

ACTA DE LA COMISIÓN ASESORA N° 281

En la ciudad de Buenos Aires, a las 10.30 horas del día 09 de mayo de 2019, conforme con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221 se reunieron en sede de A.PLA, los integrantes de la Comisión Asesora en representación de los Municipios de: **Almirante Brown**: Sr. Coordinador de Desagües Cloacales, Arq. JORGE GHILARDI; **Avellaneda**: por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Ing. Darío PALIK; **Esteban Echeverría**: MMO Bruno ABBONDANZA, **Ezeiza**: Sr. Secretario de Obras Públicas, Ing. Diego ARENA; **Hurlingham**: Sr. Responsable del área de Redes, Arq. Jorge MARTINEZ; **Ituzaingó**: por la Dirección de Redes de la Secretaría de Infraestructura Planeamiento y Desarrollo Sustentable, Arq. Romina : AMPUGNANI, **Lanús**: Ing. Federico OPICHANYJ; **La Matanza**: Sr. Secretario de Obras Públicas, Ing. Héctor TURQUIE, **Malvinas Argentinas**: Sr. Roberto CARATOZZOLO COPES; **Merlo**: Sr. Asesor del Municipio, D. Humberto Víctor OLMEDO; **Moreno**: Sr. Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, TEM Jorge Oscar ROMERO; **Morón**: TEM Luis PIETRANGELO; **Pilar**: Sr. Jeremías Manuel DIAZ; **Quilmes**: Por la Subsecretaría de Agua, Cloacas y Saneamiento Hídrico, Sra. Marianela DI LORETO; **San Isidro**: Arq. María Gabriela DÍAZ;; **San Miguel**: del Departamento de Infraestructura, Ing. José ARIAS; **Tigre**: Sr. Osvaldo Hugo CRUZ; **Vicente López**: Arq. Ana María SCAGLIUSI; por el **Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (E.N.O.H.S.A.)**: Ing. Verónica BURGELL; por el **Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**: Sr. Gerente Operativo de Seguimiento de Obras de Servicios Públicos de la Subsecretaría de Obras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Arq. Eduardo A. DOS SANTOS por la **Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica**: Dra. María Marcela RIFÓN y por **Agua y Saneamientos Argentinos (AySA)**: Sr. Gerente de Coordinación de Mejora y Mantenimiento, Ing. Fernando D. DOPAZO. Por la Agencia de Planificación el Sr. Gerente General, Ing. Héctor MANCENÍDO; el Sr. Gerente de Coordinación y Relaciones Institucionales, Lic. Walter MENDEZ y el Sr. Gerente de Planificación Técnica y Económica, Ing. Alfredo GULLER. Mediante Resolución N° 035/17 de la Agencia de Planificación fue aprobado el Reglamento de Funcionamiento

de la Comisión Asesora, tal cual lo establece el Art. 37 inc. 8 del Marco Regulatorio. En mérito a lo fijado por dicho Reglamento en los Art. 21 y sus alcances, la conducción de la Comisión Asesora, durante el período comprendido entre el 08/05/19 al 08/09/19, será responsabilidad del Municipio de La Matanza la Secretaría de Coordinación del Cuerpo y del Municipio de Ezeiza la Secretaría de Actas, con las obligaciones especificadas en los artículos 25 y 26 de dicho instrumento.-----

Se procedió a dar inicio a la reunión para la que fueron convocados según el Orden del Día, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio (Ley N° 26.221) que funcionará conforme así lo dispone la precitada norma, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora y aquellas que se dictaren al efecto de su funcionamiento. -----

ORDEN DEL DIA


REUNION DE COMISION ASESORA

09MAYO//19

Temas:


A) ORGANIZACIONAL:

- 1.- Cambio de Autoridades.. Aprobación del Acta de la reunión anterior.
- 2.- Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221)
- 3.- Designación de dos miembros para la firma del Acta.



B) OBRAS:

- 1.- Decimo Ciclo de reuniones regionales de habilitación de obras y proyectos - Región Oeste



C) VARIOS:

1. Agenda Abierta.



Siendo las 10.30 hs., se inicia la reunión verificándose que se cumple con el quórum para sesionar establecido en el artículo 12 del Reglamento de Funcionamiento aprobado mediante Resolución A.PLA N° 035/17.-----



A) 1. Se procede a la lectura del Acta de la reunión próxima pasada, se aprueba y se firma.-----

A) 2. Por instrucciones del Sr. Gerente General, el Lic. Walter MENDEZ presenta el informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).-----

Comienza su informe manifestando que de acuerdo con lo establecido en artículo 17° – “Obligación de Asistencia a las Reuniones de la Comisión”, del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión, tienen suspendido su derecho a voto los representantes de: Presidente Perón y Lomas de Zamora (desde el 11 de abril hasta el 11 de mayo) y Escobar, Ezeiza y Tres de Febrero (desde el 25 de abril hasta el 25 de mayo).-----

A su vez, recuerda que se ha distribuido vía correo electrónico la presentación realizada por AySA el 25 de abril pasado referida a las reuniones regionales de habilitación de obras – Décimo ciclo – Región Norte y CABA.-’-----

Luego, informa que se les hace entrega de un CD con el Estado de Situación del PMOEM 2019-2023 (PEyM- MyM y Operaciones para que vayan analizando y comunica que a partir del 27 de mayo al 07 de junio se harán reuniones intensivas con cada uno de los municipios para analizar en conjunto.-----

Por último, les recuerda a los representantes el pedido de AySA de enviar el contacto del los responsables del tratamiento de los Estudios de Impacto Ambiental de cada municipio.-----

A) 3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Funcionamiento, en su artículo N° 20 (último ítem), se propone designar dos miembros de la Comisión Asesora para la suscripción de la presente Acta. Por tal motivo se acuerda que los representantes del municipio San Isidro y Almirante Brown, serán los designados.-----

B)1. A continuación se da inicio al Décimo ciclo de reuniones regionales de habilitaciones de obras – Región Oeste (La Matanza, Tres de Febrero, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo y Moreno) se encuentran presentes: Ing. Juan Colombo (Gerente de Programación y Seguimiento de la Dirección de Planificación), Rodolfo Rojas (Director. Dirección de Desarrollo de la Comunidad), María Viviana Pereyra, Jefe de Planificación Técnica Dirección Regional Oeste, Jorge Roberto (Gerente Técnico Dirección Regional Oeste), Eduardo Olivero (Inspección Zona Oeste – Dirección

Redes), Fernando Kalik (Inspección Zona Oeste – Dirección Redes) y Diego Casanova (Analista- Gerencia de Programación y Seguimiento – Dirección de Planificación Regulatoria). -----

LA MATANZA:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre 2018: 88,97%): Obras finalizadas (2014 a la fecha): 28, Contratadas y en ejecución: 8, en Licitación: 0; Proyectos realizados: 2; Habitantes: 59.255. -----

-Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2018:58,33%): Obras finalizadas (2014 a a la fecha): 24, Contratadas y en ejecución:11; en Licitación: 0; Proyecto realizado: 31; Habitantes: 182.220.-----

Contratadas recientemente: RSC Un techo para Todos M1 y 2.-----

Principales obras en curso: Cisterna Planta Virrey del Pino, RPA Vinculación Acueducto con Batería Las Nieves E II y Refuerzo Calidad Rafael Castillo, Renovaciones RSA Ramos Mejía Centro Matanza Norte, Tratamiento de Barros Planta Sudoeste, RPC Aliviador Dean Funes y RSC Módulos Arco Iris Sur.-----

Finalizadas recientemente: RPA Refuerzos Tanque El Tiburón y San Enrique E II, e Interconexión de Pozos Batería Virrey del Pino II (en servicio), RPA Alimentación El Trébol y RSA El Trébol; Perforación Hipopuelche, POI Virrey del Pino; Colectores Cloacales Estanislao del Campo Tramo 1 y 2, Arco Iris Norte y Sur (en servicio); Readecuación Colector e Impulsión y nueva EBC Laferrere Centro (en servicio). -----

Habilitaciones: RSA Barrio 21 de Marzo 1, RSC Castillo 5 Norte, 7 módulos Parque Juan 2 Sudeste y 2 módulos 21 de Marzo.-----

TRES DE FEBRERO:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2018: 87,61%): Obras finalizadas (2014 a la fecha): 13, Contratadas y en ejecución: 2, en Licitación: 1; Proyecto Realizado: 0. Habitantes: 67.382. -----

Desagües Cloacales (cobertura a Diciembre de 2018: 88,43%): Obras finalizadas:5, Contratadas y en ejecución: 2, en Licitación: 1; Proyecto realizado: 0; Habitantes: 6.824.

Principales obras en curso: Renovación RSA Ciudad Jardín, VA70006, RSA Barrio Derqui y RPC Aliviador Villa Raffo.-----

Finalizadas recientemente: Ampliación EBC Loma Hermosa II, RSC Ejército de Los

Andes (en servicio) y RSC 2 módulos Loma Hermosa 2.-----
Proyectos Priorizados: Renovación RSA Caseros 2 (en licitación) y RPC Aliviador
Caseros Centro (en licitación).-----

MORON:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2018: 89,12%): Obras finalizadas: 15,
Contratadas y en ejecución: 2, en Licitación: 0, Proyecto realizado: 3; Habitantes:
86.980.-----

Desagües Cloacales: (Cobertura a Diciembre de 2018: 72,94%): Obras finalizadas
(2014 a la fecha): 16, Contratadas y en ejecución: 6, en Licitación:0; Proyecto realizado:
2. Habitantes: 62.825. -----

Principales obras en curso: Impulsión Hurlingham, Tesei Terminación y Cámara
Reguladora Sarachaga, Renovación RSA Villa Sarmiento y VA 70006, Ampliación EBC
El Palomar, Colector Castelar Villa Teseis Oeste Etapa 2 y Colector e Impulsión Villa
Tesei Oeste, RSC Morón Subetapa a II Resto 1, Morón Sur Resto, 2 módulos El
Palomar.-----

Finalizadas recientemente: Impulsión Ituzaingó – Merlo Gomez y Merlo Gómez 1 Ayerza
e Ituzaingó Udaondo Resto (en servicio), RPA e Impulsión Merlo Gómez y RPA Barrio
Paz, RSA Merlo Gómez, Renovación RSA – Morón Centro IV (en servicio), Impulsión
Derqui (en servicio) y EBC e Impulsión Merlo (en servicio).-----

Habilitaciones. RSA Ayerza, RSC Zona P5, Morón Resto Norte y Merlo.-----

HURLINGHAM:

Agua Potable (cobertura a Diciembre de 2018: 29,99 %): Obras finalizadas: 8,
Contratadas y en ejecución: 1, en Licitación: 0; Proyectos realizados: 12. Habitantes:
96.431.-----

Desagües Cloacales (cobertura a Diciembre de 2018: 54,42%): Obras finalizadas (
2014 a la fecha): 8, Contratadas y en ejecución: 6, en Licitación: 0; Proyectos
realizados: 2. Habitantes: 70.051. -----

Contratadas recientemente: RSC Tramos Faltantes Arroyo Morón.-----

Principales Obra en curso: Impulsión Hurlingham – Tesei Terminación y RPA Villa Tesei
Etapa II, Ampliación Planta Depuradora Hurlingham y Ampliación EBC e Impulsión
William Morris, Colector e Impulsión Villa Tesei Oeste, RSC Soto y Barrio Roca M3 y

M4.-----

Finalizadas recientemente: Impulsión Teseis y Hurlingham, RSA Resto Tesei 1 – Etapa 2, EBC Villa Tesei Oeste y RPC Colector Soto.-----

Habilitaciones: RSC Barrio Roca M1 y William Morris Resto.-----

ITUZAINGO:

Agua Potable (cobertura a Diciembre de 2018: 9,45%): Obras finalizadas (2014 a la fecha): 14, Contratadas y en ejecución: 13, en Licitación: 0; Proyecto realizado: 18. Habitantes: 159.421.-----

Desagües Cloacales (cobertura a Diciembre de 2018: 34,28%): Obras finalizadas (2014 a la fecha): 11, Contratada y en ejecución: 5, en Licitación: 1; Proyectos realizados: 14. Habitantes: 136.398. -----

Contratadas recientemente: Puesta en Servicio Redes Primarias OA 414/OA047, RPC Colector Martín Rodríguez Tramo 1 y RSC Ituzaingó Etapa 2 inicial.-----

Principales obras en curso: RPA Ituzaingó Etapa I, III y IV, Impulsión Udaondo I, RSA Ituzaingó 2 Resto II, 3B, 4B y 4ª Resto I, II y III, Colector, EBC e Impulsión Nuevo Ituzaingó y RSC Etapa 1 Resto.-----

Finalizadas recientemente: RPA Ituzaingó Etapa II y Terminación Impulsiones Ituzaingó 1 y 2 – Primarias a Ituzaingó 1B, RPA Udaondo II e Impulsión Udaondo II, RSA Ituzaingó 1B y Resto 1, Ituzaingó 2 Resto 1 y Udaondo M2.-----

Habilitaciones: PROCREAR Ituzaingó Agua y Cloaca, RSC El Pilar II, Impulsión y RSC Resto 11.-----

Proyectos Priorizados: RSC Parque Leloir – Cuenca 1 – Zona Martín Fierro (en licitación).-----

MERLO:

Agua Potable (cobertura a Diciembre de 2018: 48,02%).-----

Desagües Cloacales (cobertura a Diciembre de 2018: 35,43).-----

Enquadramiento de la Calidad: Rehabilitación de 4 pozos. Trabajos de Videoendoscopia, rehabilitación y limpieza, reentubado.-----

8 Sondeos finalizados: 1 corresponde al Acuífero Hipopuelche-----

Nuevas perforaciones: 2 perforaciones en ejecución y 4 perforaciones finalizadas.-----

Obras Complementarias Asociadas a la Perforación en Hipopuelche en Estación de

Rebombeo Merlo (en licitación).-----
Cañería de Interconexión, Vinculación Pozo ME077 (en licitación), RPA Refuerzo Merlo (en licitación) y Cámara Reguladora Refuerzo Merlo (en licitación).-----

MORENO:

Agua Potable (cobertura a Diciembre de 2018: 38,94%).-----

Desagües Cloacales (cobertura a Diciembre de 2018: 38,46%).-----

Encuadramiento de Calidad: Rehabilitación de 7 pozos; Trabajos de videoendoscopia, rehabilitación y limpieza, reentubado y reconstrucción de cámara subterránea. 7 Sondeos finalizados y 4 Nuevas Perforaciones a iniciar.-----

C) 1. Toma la palabra el representante de Hurlingham a fin de consultar por la obra OA 468 Impulsión Hurlingham – Tesei adjudicada a la Empresa MAKO y que ha tardado cuatro años y medio y aún no ha sido terminada. Sugiere la posibilidad de que AySA multe a la empresa y/o rescinda el contrato; ya que existen otras empresas que han cumplido en tiempo y forma y que podrían perfectamente encargarse de la obra. Por último destaca que esta obra es de vital importancia para el partido de Hurlingham, ya que condiciona otras obras que han sido finalizadas y quedarían sin servicio. El representante de AySA toma nota de la inquietud planteada.-----

A continuación, pide la palabra el representante de Moreno para hacer entrega de 2 notas a los representantes de AySA con copia a la APLA, una referida a la solicitud de reparaciones de pavimento en calles de la Localidad de Trujui- zona centro; y la segunda para solicitar información a los representantes de AySA sobre la toma de posesión del servicio de cloacas de Catonas 2 y 3, obras terminadas y finalizadas por la DIPAC que están condicionadas a la terminación y puesta en funcionamiento de la Planta Depuradora Las Catonas.. Al respecto, comenta que dado el tiempo transcurrido, considera genuino la insistencia sobre el pedido de posesión efectiva de los proyectos aludidos, incluyendo el PROMEBA 3 y San Jorge-Moreno Ciudad. Por la información que tiene desde el ENOHSA, la Planta ya está terminada a fines del año pasado pero aún no está hecha la transferencia de la misma por inconvenientes entre AySA y el ENOHSA. Pide si le pueden brindar una fecha concreta de la transferencia. Interviene la representante del ENOHSA para informar que las Plantas de Moreno y Merlo están en posibilidad de transferencia desde diciembre de 2018 y plantea que este ámbito

podría ser el lugar adecuado para lograr los acuerdos posibles. Al respecto el Lic. Méndez propone realizar una reunión para la semana siguiente entre AySA, ENOHSA, Municipio y la APLA. para trabajar en la problemática.-----

Luego solicita información sobre los Barrios La Perla y Villanueva: actualmente la factibilidad se encuentra condicionada a que se haga una ampliación de la Planta Depuradora Las Catonas, y esto sería a largo plazo. Quisiera saber si se puede tratar en forma preferencial. Seguidamente, el Ing. Jorge Roberto de AySA responde que se está estudiando y trabajando en la posibilidad de que vuelquen a un punto de radio para no necesitar y esperar la ampliación de la planta.-----

Pide la palabra el representante de Almirante Brown para informar que en su municipio se van a realizar varias obras importantes por la DIPAC, de las cuales no cuentan con información sobre las mismas y que sería importante tener algún contacto con la empresa. El Ing. Dopazo responde que es un tema que le corresponde a la Provincia de Buenos Aires pero de todos modos toma la consulta. Al respecto, plantea el representante de Hurlingham si existe la posibilidad de incorporar a la mesa a representantes técnicos de la DIPAC para tener mayor información; a lo cual el Lic. Méndez responde que se puede hacer el pedido a través del representante de la Provincia de Buenos Aires.-----

Pide la palabra el Gerente General de la APLA, Ing. Héctor Manceñido para informar que se ha enviado una nota a AySA solicitando que en un plazo perentorio informe sobre la puesta en marcha de las distintas Plantas: de Ósmosis Inversa y de Adsorción. En el día de ayer estuvieron reunidos al respecto e informaron que las dos plantas que están en el partido de Almirante Brown, están a la espera de lavado de cañerías y reemplazo de pozos; los que estaban vandalizados fueron reubicados, hay cinco pozos nuevos. En el partido de Esteban Echeverría la Planta La Lata está en servicio, están trabajando en el reemplazo de cuatro perforaciones de la batería original con una nueva cañería de interconexión. En el partido de Ezeiza, la Planta de Ósmosis Inversa Unión ya está en servicio y la Planta de Tratamiento de agua por adsorción faltan las pruebas de proceso y la continuidad con las cañerías de impulsión de salida y la finalización de los pozos de abastecimiento. Es muy probable, que estas plantas entre los meses de julio y agosto sean puestas en servicio. Propone al representante de AySA que una vez

que se tenga la respuesta de las fechas exactas de las mismas, poder realizar todos los miembros de la Comisión una visita técnica a las plantas. El representante de AySA responde afirmativamente e informa que se está trabajando en ello.-----

A continuación toma la palabra la representante del ENOHSA para dar respuesta al representante de San Miguel:sobre la Estación Bella Vista: informa que el avance está a un 95% siendo la fecha de culminación programada para la primera quincena de junio.

Finalmente, el representante de AySA informa en relación a los EIA, que si bien se han producido avances en las gestiones asociadas a la aprobación de los estudios de impacto ambiental, desde la Dirección de Sustentabilidad están precisando alguna ayuda adicional en los siguientes casos:-----

Lanús: EIA285 Impulsión y EBC Colector Industrial – CMI – Sistema Villa Olímpica, Presentado en 2016, y vuelto a entregar este año (porque lo perdieron).– Obras Ejecutadas y 2 descartadas.-----

EIA267 Ampliación, mejoras y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento cloacal (Entregado en 2015) También perdido. – Obras Ejecutadas

Quilmes: EIA240 Expansión Cloacal Quilmes RSC Catamarca – Las Piedras – Solano Norte – Quilmes Sur (Entregado 2014) Lo perdieron varias veces. – Obras Ejecutadas

Vicente López: EIA263 Renovación red secundaria Florida Este, Red primaria de Agua vinculo Ribereño U11.(entregado en 2015, y vuelto a entregar en 2016) – Obras Ejecutadas.-----

EIA269 Rehabilitación del río subterráneo Villa Adelina (entregado en 2015)-----

EIA247 Anulación y nueva red cloacal calle Piedrabuena (entregado en 2014) – Obras Ejecutadas.-----


La Matanza: EIA258 Redes Primarias, secundarias, colectores y sondeos de reconocimiento (entregado en 2015).-----

Tres de Febrero: EIA271 Expansión, mejora y mantenimiento en el Partido de Tres de Febrero (entregado en 2016) – Obras Ejecutadas.-----

Morón, La Matanza e Ituzaingó: EIA272 Ampliación, mejoras de agua y cloaca. Merlo Gómez y Resto norte (entregadas a los 3 municipios en 2016) – Obras Ejecutadas. -----

No habiendo otros temas, se procede a fijar como temas primarios para la próxima reunión a saber: Presentación a cargo de AySA sobre los Planes de Operación y


Mejoras y Mantenimiento de la Revisión Quinquenal 2019 / 2023 del PMOEM.-----
Siendo las 12.00 horas se da por finalizada la jornada, quedando concertada la próxima
reunión para el día 23 de mayo del año 2019 a las 10.30 horas en sede de la Agencia
de Planificación.-----



Secretario Coordinador La Matanza



Secretario de Actas Ezeiza



San Isidro




Almirante Brown


Agencia de Planificación:



Ing. Alfredo Guller



Ing. Héctor Manceñido

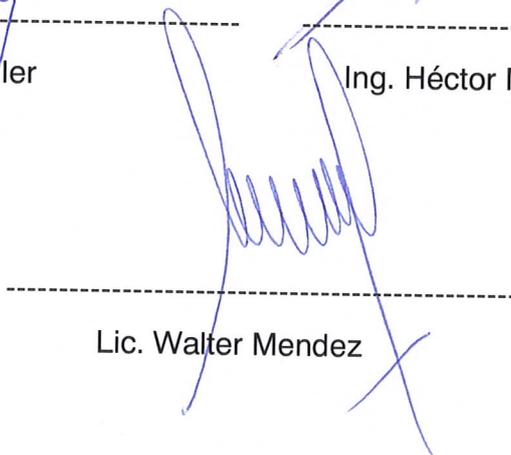

Lic. Walter Mendez
